
- 제9대 속초시의회(제315회 임시회) -

2022년도 주요업무보고

보고순서

□ 주요현황	1
□ 2022년도 주요시책 목록	2
□ 2022년도 주요시책 추진상황	3
1 사계절 꽃으로 덮인 가로경관 조성	3
2 장기미집행 도시공원 조성	4
3 속초 국화전 개최	6
4 녹색쌈지숲 조성	7
5 영랑근린공원 민간특례 조성사업	8
6 산림재해방지 조림사업	9
7 산림경영 기반구축(숲가꾸기)	11
8 청대산 산림욕장 운영	12
9 설악산 자생식물원 운영	13
10 산불방지대책사업	14
11 산림·일반 병해충 방제사업	15
12 도시공원 녹지 관리	16
13 가로수 및 수벽 관리	17
14 도시녹지 및 가로환경 정비	18
15 설악산 자생식물원 제2주차장 조성사업	19
16 2023년 강원세계산림엑스포 개최(부개최지)	20
17 청초호유원지 남측 화장실 개축 및 샤워장 설치공사	21
18 청초호유원지 북측 데크로드 조성사업	22
19 청초호유원지 농구장 교체사업	23
□ 민간단체 지방보조금 지원현황	24

주요 현황

1. 직원현황

구 분	계	5급 행정 시설 녹지	6급					7급				8급					9급		
			소계	행정 녹지	시설 녹지	행정 시설 녹지	행정 시설 공원 녹지	소계	녹지	행정 녹지	시설 녹지	소계	행정 녹지	공업 녹지	행정 시설 녹지	운전	소계	행정	녹지
정 원	17	1	5	2	1	1	1	6	1	4	1	3	1	1	1	-	2	1	1
현 원	17	1	5	2	1	1	1	5	1	4	-	3	1	1	-	1	3	1	2
증감	0	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-1	0	-	-	-1	1	1	-	1

※ 정원 외 인원 : 청원산림서기(3명)

2. 팀별 직원현황

구 분	계	공원행정	산림조성	산림보호	공원관리	공원계획
정 원	17	5	3	3	4	2
현 원	17	5	3	3	4	2
결 원	-	-	-	-	-	-

3. 위원회 현황

위 원 회 명	위원장 성 명	위 원 수			'22년도 개최횟수	여성위원 위촉비율	설 치 근 거	비고
		계	남	여				
산사태취약지정 위원회	이선규	7	7	-	-	-	산림보호법 제45조	

4. 관리시설 현황

시 설 명	관리책임자	층 수	연 면 적 (건축면적)	사 용 내 역	비고
꽃묘장	공원녹지과	1	13,066㎡	관리사 및 비닐하우스(18동)	
설악산자생식물원	“	1	44,562㎡ (115.5㎡)	자생식물원 운영 관리	
산불대응센터	“	1	1,863㎡ (231.72㎡)	산불진화장비 보관 및 진화대 대기 등	
청초호유원지 관리사무실	“	1	45.83㎡	청초호유원지 관리	
청초호유원지 공중화장실(1)	“	1	43.37㎡	공중화장실	
청초호유원지 공중화장실(2)	“	1	43.37㎡	공중화장실	
청초호유원지 공중화장실(3)	“	1	43.37㎡	공중화장실	
엑스포 잔디광장	“	-	14,625.4㎡	인조잔디, 육상트랙, 인라인트랙	

2022년도 주요시책 목록

(단위:백만원)

사 업 명	'22년도 투자계획					착수 일자	완료예정일 (현공정율)	비고
	계	국비	도비	시비	민자등			
계	15,578 (4,310)	1,620	1,004	12,954 (4,310)	-	-	-	-
사계절 꽃으로 덮인 가로경관 조성(주요) (연례반복 / 840백만원)	840 (170)	-	-	840 (170)	-	2022.01.01	2022.12.31 (70%)	
장기미집행 도시공원 조성(현안) (‘20~‘25년 / 20,720백만원)	4,000 (4,000)	-	-	4,000 (4,000)	-	2022.9월	2022.12.31 (90%)	
속초 국화전 개최(주요) (연례반복 / 140백만원)	140 (140)	-	-	140 (140)	-	2022.9월	2022.11.19 (0%)	
녹색쌈지숲 조성(주요) (연례반복 / 200백만원)	200	-	130	70	-	2022.03.07	2022.7.29. (60%)	
영랑근린공원 민간특례조성사업(현안) (‘18~‘24년 / 19백만원)	19	-	-	19	-	2022.6월	2024.2.28 (30%)	
산림재해방지 조림사업(현안) (연례반복 / 927백만원)	927	430	149	348	-	2022.09.01	2022.12.31 (0%)	
산림경영 기반구축(숲가꾸기)(주요) (연례반복 / 861백만원)	861	433	128	300	-	2022.6월	2022.9월 (0%)	
청대산 산림욕장 운영 (주요) (연례반복 / 267백만원)	267	-	62	205	-	2022.5.10.	2022.12.31 (20%)	
설악산 자생식물원 운영(주요) (연례반복 / 322백만원)	322	26	8	288	-	2022.01.03	2022.12.31 (50%)	
산불방지대책사업 (주요) (연례반복 / 3,816백만원)	3,816	513	422	2,881	-	2022.01.01	2022.12.31 (70%)	
산림·일반 병해충 방제사업 (주요) (연례반복 / 241백만원)	241	98	28	115	-	2022.01.01	2022.12.31 (60%)	
도시공원 녹지 관리 (주요) (연례반복 / 664백만원)	664	-	14	650	-	2022.01.01	2022.12.31 (70%)	
가로수 및 수벽 관리(주요) (연례반복 / 533백만원)	533	-	-	533	-	2022.01.01	2022.12.31 (80%)	
도시녹지 및 가로환경정비(주요) (연례반복 / 330백만원)	330	-	-	330	-	2022.05.02	2022.10.31 (35%)	
설악산 자생식물원 제2주차장 조성사업(현안) (‘22년 / 700백만원)	700	-	-	700	-	2022.06.13	2022.12.31 (5%)	
2023년 강원서머신티어링엑스포 개최(부가채지)(현안) (‘22~‘23년 / 468백만원)	468	-	63	405	-	2022.01.26	2022.12.31 (30%)	
청초호유원지 남측 화장실 개축 및 샤워장 설치공사(현안) (‘22년 / 450백만원)	450	-	-	450	-	2022.05.03	2022.8월 (30%)	
청초호유원지 북측 데크로드 조성사업(현안) (‘22년 / 400백만원)	400	-	-	400	-	2022.05.03	2022.7월 중 (60%)	
청초호유원지 농구장 교체사업(현안) (‘22년 / 400백만원)	400	120 (기금)	-	280	-	2022.04.15	2022.7월 중 (90%)	

※ ()은 미확보액

2022년도 주요 추진 시책

① 사계절 꽃으로 덮인 가로경관 조성 (주요)

※ 사계절 꽃으로 덮인 도시공간 조성으로 관광속초 이미지를 극대화하고 특색있는 가로경관을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 주요 도로변 및 관광지 주변 40개소
- 사업내용
 - 계절꽃묘 생산: 팬지 등 19종 85만본
 - 주요 도로변 계절꽃 식재·관리: 가로화단 및 원형화분 40개소
 - 교량 난간걸이 꽃길 조성: 청대교, 엑스포 잔디광장 등 6개소
- 사업비: 840백만원 (인건비 565, 재료비 195, 일반운영비 80)
- 사업기간: '22. 1월 ~ 12월

□ 주요 추진상황

- 가로변 봄꽃 생산 및 식재: '21. 1월 ~ 5월 / 비올라 등 10종 33만본

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
4,550	2,030	840	840 (170)	-	-	840 (170)	-	840

※ ()는 미확보 사업비

□ 문제점 및 대책

- 문제점: 사계절 꽃 생산, 식재에 따른 사업량 및 인건비 증가로 예산증액 필요
- 대책: 제2회 추가경정예산에 사업비 추가반영

□ 향후계획

- '22년 꽃묘장 관리인 운영: '22. 1월 ~ 12월 / 2명(기간제근로자)
- '22년 여름꽃 생산 및 식재: '22. 7월 ~ 8월
- '22년 가을꽃(국화) 생산 및 식재: '22. 7월 ~ 10월

2 장기미집행 도시공원 조성 (현안)

※ 장기미집행 도시계획시설 일몰제에 따라 미집행 도시공원에 대해 실시계획인가 및 토지보상을 실시하여 체계적인 도시계획시설 (도시공원) 조성 및 도시 난개발 방지

□ 사업개요

- 위 치: 속초시 교동 767-39일원 외 161필지
- 사 업 량: 만리공원 외 2개소(논산·중앙공원)
- 사업내용: 실시계획인가 및 편입토지 보상
- 사 업 비: 20,720백만원
- 사업기간: '20. 6. 26. ~ '25. 5. 31

□ 주요 추진상황

- 장기미집행 도시계획시설(도시공원) 실시계획 인가고시: '20. 6. 26
- 2020년 지방채 50억 발행(강원도 지역개발기금): '20. 9. 1
- 2021년 지방채 17억 발행(기획재정부 공공자금관리기금): '21. 4. 1
- 만리공원 토지보상 1차분 보상완료: '21. 4월 ~ 12월
- 만리공원 편입토지 재감정평가 실시: '22. 3. 4

□ 재원확보 현황

(단위: 백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
20,720	5,120	5,351	4,000 (4,000)	-	-	4,000 (4,000)	-	6,249

※ ()는 미확보 사업비

□ 문제점 및 대책

- 지가상승 기대심리로 토지소유주들의 보상가 기대치와 실보상가액 (감정평가금액)의 차이에 따른 불만으로 보상협의 난항 예상
- 재감정평가 실시 후 토지소유주 등과 충분한 사전협의 실시
 - 매도 의사 토지소유주 부동산 매도의향서 징구
 - 충분한 보상협의 후에도 미협의시 수용재결 추진
 - 추가 소요 토지보상액 시비 대응

□ 향후계획

- 만리공원 편입토지 사전 보상협의: '22. 7월 ~ 8월
- 매도 의사 편입토지에 대한 토지보상비(시비) 확보: '22년 2회 추경

3 속초 국화전 개최 (주요)

※ 가을철 설악의 단풍과 함께 시민 및 관광객들에게 가을의 정취를 만끽할 수 있는 볼거리 제공과 특색있는 국화 작품 전시를 통한 도심 속 힐링공간 조성

□ 사업개요

- 기 간: '22. 9월 ~ 11월
- 위 치: 청초호유원지 분수광장 일원
- 사 업 량: 국화꽃 등 10만본 전시, 포토존 조성 및 야간 경관조명 설치
 - － 국화꽃길 조성: 국화꽃 등 식재 10만여본
 - － 국화 포토존 조성: 포토존 10개소
 - － 야간 경관조명 설치: 수목 및 작품국화 조명 설치
- 사 업 비: 140백만원
- 사업방법: 시 직영 및 도급사업

□ 주요 추진상황

- '21년 국화전 추진: '21. 10. 4 ~ 11. 5
- '21년 국화전 화단 철거: '21. 11. 19

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
705	320	105	140 (140)	-	-	140 (140)	-	140

※ ()는 미확보 사업비

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- '22년 국화전 행사용 꽃묘 생산 및 관리: '22. 7월 ~ 9월
- '22년 국화 전시 계획 수립 및 준비: '22. 9월
- '22년 청초호유원지 국화 전시: '22. 10월 ~ 11월

4] 녹색쌈지숲 조성 (주요)

※ 시가지 및 생활권 주변에 녹색 공간 확충으로 시민들 및 관광객들에게 쾌적하고 아름다운 도시경관 조성

□ 사업개요

- 위 치: 속초시 조양동 1506(메가박스 앞)
- 사 업 량: 1개소(1,500m²)
- 사업내용: 수목, 초화류 식재 및 편익시설, 경관조명 설치 등
- 사 업 비: 200백만원(도 130, 시 70)
- 사업기간: '22. 1월 ~ 7월
- 사업방법: 도급시행

□ 주요 추진상황

- 2022년 녹색쌈지숲 실시설계 용역 완료: '22. 3. 7
- 2022년 녹색쌈지숲 조성사업 추진: '22. 4. 15 ~ 7. 13
- 2022년 녹색쌈지숲 조성사업(전기공사) 추진: '22. 4. 15 ~ 7. 13

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
2,200	1,200	400	200	-	130	70	-	400

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 수목 식재 및 시설공사 추진: '22. 7월
- 지속적인 유지관리: 연중

5 영랑근린공원 민간특례 조성사업 (현안)

※ 장기미집행 공원의 해소로 민간공원 추진자가 공원 부지 매입 및 조성 후 기부채납(70%)을 통해 도시공원을 조성하는 사업임
(※ 추진근거: 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제21조의2)

□ 사업개요

- 위 치: 속초시 금호동 산 278번지 일원(동부아파트 뒤편) / 영랑근린공원
- 면 적: 143,484㎡(공원 100,439, 비공원 43,045)
- 사업방식: 제안에 의한 민간개발방식
 - 부지의 70% 공원조성 기부채납, 30% 비공원시설 조성 사업
- 사업내용: 공원 조성 및 비공원시설(공동주택) 건설
- 사업기간: 2018년 ~ 2024년
- 사업시행자: 속초시, 영랑공원개발 주식회사

□ 주요 추진상황

- 교통영향평가 수정 의결: '21. 5. 24
- 감정평가(재감정) 추진: '21. 11월 ~ 12월
- 편입 사유지 매각절차 이행: '22. 1. 27
- 강원도 건축위원회 건축허가 사전 승인 완료: '22. 5. 11
- 토지보상 미협의를 재결신청 열람·공고: '22. 5. 27
- 토지보상 미협의를 강원도 지방토지수용위원회 재결: '22. 6. 30

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
38	19	-	19	-	-	19	-	-

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 영랑근린공원 민간특례 조성사업 타당성 검토용역 실시: '22. 7월 중
 - 사업 관련 주요 변경사항 검토, 사업의 수익구조 분석, 변경 협약(안) 검토 등

6 산림재해방지 조림사업 (현안)

※ 2019년 고성·속초 산불발생에 따른 복구조림사업을 통하여 산림의 공익적·경제적 기능 회복에 기여

□ 사업개요

- 위 치: 관내 산불피해지
- 사 업 량: 산림재해방지 조림 188ha
- 사업기간: '22. 1월 ~ 12월
- 사 업 비: 2,727백만원(국 1,330, 도 419, 시 978)
 - 21년 명시이월: 1,800백만원 (국 900, 도 270, 시 630)
 - 22년 본 예 산: 927백만원 (국 430, 도 149, 시 348)
- 사업내용: 산불피해지 내 어린나무 188ha 식재(1,500본/ha)

□ 주요 추진상황

- 조림 사업 국도비 보조금 반납 건의(對‘강원도): ‘21. 1. 15
- 조림 사업 국도비 보조금 반납 건의(對‘산림청): ‘21. 1. 22
- 산불피해 입목벌채 및 조림을 위한 소유주 파악: ‘22. 2. 3
- 한화호텔앤리조트 소유 산불피해지 피해목 벌채(29.5ha): ‘22. 3. 14 ~ 6. 11
- 조림설계·감리 및 사업시행 지침 해석(산림청, 강원도): ‘22. 5. 24
 - 『조림 설계 감리 및 사업시행 지침(산림청 2022.1.1.개정)』 상 『조림 예정지 정리작업』에 산불피해목 벌채를 반영할 수 있는지 여부 해석 의뢰(對 ‘강원도, 對 ‘산림청)
 - 산불피해목 벌채 반영 불가 해석
- 고성·속초 산림비상대책위원회 면담: ‘22. 6. 8

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
3,793	1,066	1,800	927	430	149	348	-	-

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 조림사업 시행 전 산주자력(自力) 벌채 필요
- 2022년 현재 3년간, 산림에 방치된 피해목은 산림바이오매스로서의 가치가 없어, 수익구조상 민간업체 참여 불투명

○ 대책

- 산주 자력 벌채 권유 서한 송부

□ 향후계획

- 벌채미동의 산주 벌채시행 권유 서한 송부: '22. 7월
- 산림재해방지 조림사업 실시설계용역 시행: '22. 7월 ~ 8월
- 추기 산림재해방지 조림사업 시행: '22. 9월 ~ 11월

7 산림경영 기반구축(숲가꾸기) (주요)

※ 산림의 경제적·환경적 가치 제고로 기후변화에 대응하고, 숲가꾸기 사업을 통한 공익적 가치 증진으로 녹색성장 기반조성에 기여

□ 사업개요

- 위 치: 관내 도시권 주변 산림
- 사업기간: '22. 1월 ~ 12월
- 사 업 비: 861백만원(국 433, 도 128, 시 300)
- 사업내용
 - － 공공산림가꾸기 일자리사업: 18명(관내 위험목 제거, 산림부산물 수집 등)
 - － 정책숲가꾸기 330ha: 풀베기사업을 통한 조림목 관리 및 생육증진

□ 주요 추진상황

- 산림일자리 사업 근로자 선발운영: '22. 3. 14
- '22년 숲가꾸기(풀베기) 1차사업 시행: '22. 6. 14

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
6,803	4,289	783	861	433	128	300	-	870

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 산림일자리 사업 하반기 근로자 운영: '22. 7월 ~ 11월
- 2022년 숲가꾸기(풀베기) 2차사업 시행: '22. 8월 ~ 9월
- 2022년 숲가꾸기(풀베기) 감리용역 시행: '22. 7월 ~ 10월

8 청대산 산림욕장 운영 (주요)

※ 청대산 산림욕장 유지관리를 통하여 관광자원을 개발하고 시민 및 관광객들에게 산림서비스를 제공

□ 사업개요

- 위 치: 청대산 등산로 12개 노선 8.8km
- 사업기간: '22. 1월 ~ 12월
- 사 업 비: 267백만원(도 62, 시 205)
 - 청대산 산림욕장 운영: 171백만원(시비 100%)
 - 관내 숲길정비사업: 96백만원(도 62, 시 34) ※지방이양사업(산림복지분야)
- 운영인원: 기간제근로자 3명
- 사업내용
 - 등산로 정비 (야자매트 및 안내판설치, 파고라·벤치 등 편의시설 유지관리)
 - 주차장 시설물 정비 및 등산로 수목 유지관리

□ 주요 추진상황

- 산림휴양시설관리 기간제 근로자 3명 선발운영: '22. 1. 3
- 청대산 등산로 정비사업 실시설계 용역 완료: '22. 1. 25. ~ 3. 15
- 청대산 등산로 정비사업 추진 중: '22. 5. 10. ~ 7. 8

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
2,192	1,442	213	267	-	62	205	-	270

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 하반기 시설물 등 정비사업 시행: '22. 7월 ~ 12월

9 설악산 자생식물원 운영 (주요)

- ※ 우리 고유의 향토 자생식물 등 초본류 및 관목류의 체계적인 보존·육성
- ※ 산림작물에 대한 탐방·체험을 통한 자연학습 교육홍보 전개

□ 사업개요

- 위 치: 노학동 산337번지 외 6필지(4.5ha)
- 사업기간: '22. 1월 ~ 12월
- 사 업 비: 322백만원(국 26, 도 8, 시 288)
 - 자생식물원 운영: 269백만원(시비 100%)
 - 숲해설 운영: 53백만원(국 26, 도 8, 시 19)
- 운영인원: 공무원근로자 2명, 기간제근로자 2명
- 사업내용: 초화류 및 편익시설 유지관리 등

[조성개요]

- 위 치 : 노학동 산337번지 외 6필지 (면적 : 4.5ha)
- 조성기간 : 2009년 ~ 2011년 (3년)
- 사 업 비 : 1,500백만원 (국비 750 도비 225 시비 525)

□ 주요 추진상황

- 자생식물원 관리 기간제 근로자 2명 선발운영: '22. 1. 3
- 숲해설가 관련 사업 운영: '22. 4. 4 ~ 12월
- 자생식물원 온실원 수직정원 조성공사 완료: '22. 3. 30
- 자생식물원 토양개량 및 유희공간 화단조성 완료: '22. 5. 2
- 자생식물원 여름꽃 식재사업 완료: '22. 6. 29

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
4,230	3,409	239	322	26	8	288	-	260

□ 문제점 및 대책

- 문제점: 상반기 중 사업비 집행완료로 하반기 사업예산 반영 필요
 - 계절꽃 화단 조성 사업: 40,000천원 / 수생식물원 황폐지 보강식재 사업: 23,000천원
- 대 책 : 제2회 추가경정예산에 사업비 추가 반영

□ 향후계획

- 하반기 시설물 등 정비사업 시행: '22. 7월 ~ 9월

10 산불방지대책사업 (주요)

- ※ 산불방지 대응태세 확립 및 유관기관 협력체계 강화
- ※ 원인별·시기별 맞춤형 산불예방 활동으로 산불발생 위험도 저감
- ※ 신속한 초기대응 및 안전한 진화활동으로 산불피해 최소화

□ 사업개요

- 기 간: 봄철(2. 1. ~ 5. 15.) / 가을철(11. 1. ~ 12. 15.)
- 인력현황: 138명(진화대 35명, 감시원 103명)
- 사 업 비: 3,816백만원(국 513, 도 422, 시 2,881)
- 사업내용: 봄·가을철 산불방지 인력 및 장비운영

□ 주요 추진상황

- 봄철 산불비상대책본부 상황실 운영: '22. 1. 5. ~ 5. 31
- 봄철 산불전문예방진화대 조기운영: '22. 1. 5. ~ 5. 31
- 봄철 산불예방감시원 운영: '22. 2. 1. ~ 5. 22
- 산불예방 및 진화를 위한 장비구입: '22. 1월 ~ 5월
 - － 차량무전기 1개, 이동중계기 1개, 산불감시초소 2동, 소형파쇄기 1대, 기계화 시스템 1세트, 휴대용무전기 17개, 등짐펌프 310개, 휴대용 열화상카메라 1대 등
- 봄철 산불진화 공동 임차헬기 운영: '22. 1. 10 ~ 5. 31
- 봄철 산불진화 공동 임차헬기 추가운영: '22. 6. 1 ~ 7. 3

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
24,503	14,777	3,013	3,816	513	422	2,881	-	2,897

□ 문제점 및 대책

- 봄·가을철 산불조심기간 연장운영에 따른 진화대·감시원 인건비 부족
 - － 겨울가뭄 장기화 및 봄철 지속된 건조한 날씨로 전국적으로 많은 산불이 발생하여 산불비상대책기간을 연장함에 따라 가을철 진화대 및 감시원 인건비 부족
- 추경 예산편성시 인건비 추가 반영 필요

□ 향후계획

- 여름철 산불대응센터 관리원 3명 운영: '22. 6. 7. ~ 10. 16
- 가을철 산불방지대책본부 운영: '22. 11. 1. ~ 12. 15

11 산림·일반 병해충 방제사업 (주요)

- ※ 솔잎혹파리 등 산림병해충 피해확산 저지를 위한 예찰·방제 강화
- ※ 돌발병해충에 대한 조기발견·선제적 방제로 시민 및 수목피해 최소화
- ※ 속초해수욕장 송림 방제사업으로 쾌적한 산림휴식공간 제공

□ 사업개요

- 위 치: 관내 산림 및 도심지 가로수 등
- 사업량: 병해충 방제 80ha
- 사업비: 241백만원(국 98, 도 28, 시 115)
- 사업내용
 - 솔잎혹파리 등 산림병해충 방제사업 / 속초해수욕장 송림 종합방제사업
 - 가로수 및 산림연접지역 돌발병해충 방제사업

□ 주요 추진상황

- 산림병해충 예찰방제단 선발 운영(3명): '22. 3. 2 ~ 10. 31
- 생활권 수목진료 민간컨설팅 용역: '22. 4. 11 ~ 10. 7
- 속초해수욕장 송림 종합방제사업: '22. 4. 28 ~ 5. 24
- 미국흰불나방 유충 등 돌발병해충 방제사업: '22. 5. 9 ~ 6. 5
- 솔잎혹파리 방제사업(수간주사): '22. 6. 2 ~ 6. 21
- 일반병해충 예찰방제단 선발 운영(3명): '22. 6. 7 ~ 9. 15

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
1,149	630	117	241	98	28	115	-	161

□ 문제점 및 대책

- 최근 겨울철 폭설 및 여름철 이상기온 등으로 돌발병해충 발생 증가
 - 2021년 여름철 300건 이상의 미국흰불나방 발생 민원이 발생함에 따라 올해 5월부터 6월까지 가로수 수간주사 방제사업을 완료하였으나, 가로수를 제외한 민가를 중심으로 미국흰불나방이 산발적으로 발생하는 바, 예찰방제단을 집중 운영하여 주요 민원발생지역의 선제적 방제작업 실시

□ 향후계획

- 산림 및 일반병해충 예찰방제단 운영: '22. 7월 ~ 10월
 - 여름철 돌발병해충 방제 민원처리, 산림지역 병해충 예찰 및 시료채취 등

12 도시공원 녹지 관리 (주요)

- ※ 유원지 및 도시공원 연중관리를 통해 청결하고 안전한 휴식 공간 제공
- ※ 도심 속 녹색쉼터의 지속적 조성관리로 쾌적한 도심 속 녹색환경 제공

□ 사업개요

- 위 치: 청초호유원지 외 74개소
- 사업기간: '22. 1월 ~ 12월
- 사 업 비: 664백만원(도 14, 시 650)
- 사업내용
 - 시설물 보수 보강, 조경수 보완 식재, 제초작업 및 잔디깎기, 병해충 방제, 수목·공중화장실·어린이놀이시설·잔디광장 관리, 분수대 운영 관리 등

□ 주요 추진상황

- 청초호유원지 화장실 정비 및 청소관리(3개소): '22. 1월 ~ (연중)
- 어린이놀이시설 안전점검 위탁용역 시행: '22. 1월 ~ 12월 / 17개소
- 청초호유원지 수목 전정사업 완료: '22. 2월 ~ 5월 / 북측, 시민식수공원, 남측
- 청초호유원지 및 영랑호 산책로 옥외용 벤치 설치: '22. 3월 / 12개소
- 청초호유원지 LED 공원등기구 교체 완료: '22. 3월 ~ 4월 / 39개소
- 공원 및 녹지대 제초 및 잔디깎기: '22. 4월 ~ (연중)

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
5,975	3,503	1,108	664	-	14	650	-	700

□ 문제점 및 대책

- 문제점: 청초호유원지 및 도시공원 시설물 정비에 따른 예산증액 필요
- 대 책: 제2회 추가경정예산 사업비 반영 요구(요구액: 50백만원)

□ 향후계획

- 도시공원 내 수벽 관목 보식 및 공원 시설물 정비: '22. 8월 ~
- 공원·녹지대 월동 관리: '22. 11월 ~ 12월

13 가로수 및 수벽 관리 (주요)

- ※ 도심지역 녹지시설로 도시 내 녹지축의 형성과 특징적인 가로공간 조성
- ※ 가로수 및 수벽 관리를 통한 쾌적한 도시경관 조성

□ 사업개요

- 위 치: 동해대로 외 46개 노선(은행나무 외 19종 / 12,903본)
- 사업내용: 가로수 전정 및 식재, 피해목(고사목) 정비, 병충해 방제 등
- 사업비: 533백만원
- 사업기간: '22. 1월 ~ 12월
- 사업방법: 도급 및 시 직영

□ 주요 추진상황

- 주요도로변 관목류 보식 완료: '22. 4월
- 영랑호수공원 수목 전정 완료: '22. 4월
- 온천로 왕벚나무 식재 완료: '22. 5월
- 가로수 병해충 나무주사 완료: '22. 5월
- 주요도로변 수벽 전정 시행: '22. 6월 ~ 7월
- 설악산로 왕벚나무 식재 완료: '22. 6월
- 설악로데오거리 봄꽃 식재 및 관리 완료: '22. 6월
- 주요도로변 중앙분리대 가로화단 정비 시행: '22. 5월 ~ 10월
- 소평로 가로수 수종교체 시행: '22. 6월 ~ 7월
- 설악로데오거리 계절꽃 식재 및 관리 시행 : '22. 7월 ~ 11월

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
3,823	2,072	618	533	-	-	533	-	600

□ 문제점 및 대책

- 문제점: 주요도로변 가로수 및 관목 보식에 따른 예산증액 필요
- 대책: 제2회 추가경정예산에 사업비 추가반영

□ 향후계획

- 가로수 및 조경수 보식 시행: '22. 9월 ~ 11월
- 동절기 주요도로변 관목류 월동관리 시행: '22. 11월

14 도시녹지 및 가로환경 정비 (주요)

- ※ 여름철 주요도로변 및 인도변 잡초 제거로 쾌적한 가로경관 제공
- ※ 도시공원 및 녹지대 잔디관리로 잔디의 원활한 생육과 도시미관 향상에 기여
- ※ 관광도시 이미지 제고 및 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치: 청초호유원지 등 공원 및 녹지대 75개소,
(설악산 입구 ~ 고속버스터미널 외 12개 구간)
- 사업량: 도시공원 및 녹지대(132,138㎡),
34.15km(양방향 3회 이상) / 면적: 81,334㎡
- 사업내용: 예초기 등을 활용한 예초 및 제초작업
- 사업비: 330백만원
- 대상지: 주요도로변과 인도변, 공원 및 녹지대
- 사업기간: '22. 5월 ~ 10월
- 사업방법: 시 직영

□ 주요 추진상황

- 도시녹지 및 가로환경 정비 대상지 조사: '22. 1월 ~ 2월
- 도시녹지 및 가로환경 정비 계획 수립: '22. 4월
- 도시녹지 및 가로환경 정비 작업반 편성: '22. 4월
- 도시녹지 및 가로환경 정비사업 시행: '22. 5월 ~ 10월

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
2,138	1,201	247	330	-	-	330	-	360

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획


- 도시녹지 및 가로환경 정비사업 완료: '22. 10월

15 설악산 자생식물원 제2주차장 조성사업 (현안)

※ 관내 주요 관광시설인 설악산자생식물원의 만성적인 주차문제를 해결하고자 기존 자생식물원 유희부지에 약2,243㎡의 제2주차장을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업명: 설악산자생식물원 주차장 조성
- 위치: 노학동 산337 일원
- 사업기간: 2022. 1월 ~ 12월
- 사업비: 700백만원(시비)
- 사업내용: 주차장 2,243㎡, 주차면수 36면 조성
- 위치도 및 사진

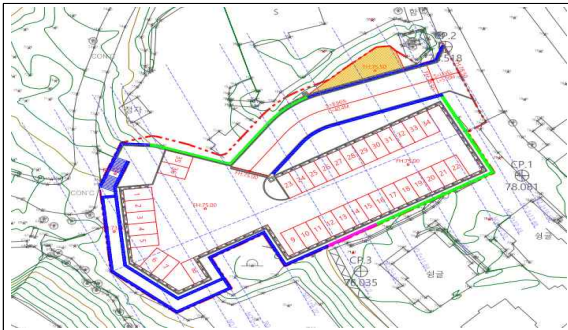

위치도(노학동 산337 일원)



현장 사진

□ 주요 추진상황

- 설악산자생식물원 주차장 조성계획 수립: '21. 9. 15
- 주차장 대상지 연접 거주자 민원 협의: '22. 1. 10 ~ 4. 18
- 실시설계 용역 완료: '22. 4. 22
- 산지전용허가 완료: '22. 5. 13
- 일상감사 및 계약심사 완료: '22. 5. 20
- 본사업 착공: '22. 6. 29

□ 재원확보 현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
700	-	-	700	-	-	700	-	-

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 제2주차장 조경사업 착공 및 준공: '22. 10월 ~ 11월
- 본사업 준공: '22. 12월

16 2023년 강원세계산림엑스포 개최(부개최지) (현안)

※ 강원도의 성공적인 산림녹화 경험과 산불방지·산림복원·생태관광 등 성공모델을 국제사회 공유 및 도내 임산물 수출홍보 등 강원세계산림엑스포 개최를 통한 새로운 강원 신성장 동력 창출

□ 사업개요

- 행사명: 2023 강원세계산림엑스포
- 기간: 2023. 5. 4. ~ 6. 6.(34일간)
- 장소: 고성군 토성면 인흥리(강원도 세계잼버리수련장 일원)
- 면적: 1,218,597m²(주행사장 491,983m² / 부행사장 726,614m²)
 - 속초(자생식물원), 인제(만해마을), 양양(송이밸리자연휴양림), 고성(DMZ박물관, 통일전망대)
- 소요예산: 297억원(국비 89, 지방비 134, 수익사업 74)
- 주최/주관: 강원도 / 강원세계산림엑스포조직위원회
- 주요내용: 전시관 운영[7개관(주제관 1, 부제관 6), 모험전망대 1]

□ 주요 추진상황

- (재)강원세계산림엑스포 조직위 공무원 파견: '21. 3. 25
- '21년도 강원세계산림엑스포 사업비 시부담금(640백만원) 지출: '21. 6. 7
- '22년 제1회 (재)강원세계산림엑스포 이사회(서면)개최: '22. 1. 3
 - 강원세계산림엑스포 사업계획 변경
 - 당초 : 2022강원세계산림엑스포('22.5.4~6.5) → 변경 : 2023강원세계산림엑스포('23.5.4~6.6)
- '22년도 강원세계산림엑스포 사업비 시부담금(260백만원) 지출: '22. 1. 26.

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
1,108	-	640	468	-	63	405	-	-

□ 문제점 및 대책

- 문제점: 23년 본행사 대비 시설물 보수 및 보강 필요
 - 자생식물원 중양계단 보수사업: 55,000천원 / 식물원 내 추가계단 조성 및 수목 전지사업: 48,000천원
 - 목재 시설물 도색작업: 20,000천원
- 대책: 제2회 추가경정예산 사업비 추가 반영

□ 향후계획

- '23년도 강원세계산림엑스포 개최 준비 만전 : '22. 7월 ~ '23. 5월

17 청초호유원지 남측 화장실 개축 및 샤워장 설치공사 [현안]

- ※ 청초호유원지 남측 공중화장실 노후에 따른 급격한 내구성 저하로 화장실을 리모델링하여 이용자의 불편 해소 및 안전을 확보코자 함.
- ※ 청초호유원지를 관리하는 근로자의 근무환경 개선을 위해 공원 사무실 내 편의시설(샤워장)을 설치·제공하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치: 조양동 1544-2(청초호유원지 남측)
 - 남측 화장실(공원사무실 옆)
- 사업량: 화장실(1개소) 개축 및 샤워장 설치 1식
- 사업내용: 공중화장실 개축 및 근로자 편의시설(샤워장) 설치
- 사업비: 450백만원(전액 시비)
- 사업기간: '22. 1월 ~ 8월
- 사업방법: 도급 시행

□ 주요 추진상황

- 사업 계획 수립: '22. 1. 11
- 공공건축사업 건축기획 의뢰(건축과): '22. 1. 12
- 실시설계용역 완료: '22. 3월
- 일상감사 및 계약심사 완료: '22. 3월말
- 공사(건축, 기계설비, 전기) 착공: '22. 5. 3
 - 봄꽃 화단 조성 및 청초누리 봄빛행사 등에 따라 시민 불편을 해소하고자 5월부터 작업 착수
 - 구조물 철거 및 철근콘크리트공사 진행

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
450	-	-	450	-	-	450	-	-

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 공사(건축, 기계설비, 전기) 준공: '22. 8월 ~ 9월
- 여성안심 비상벨(통신) 설치: '22. 9월 ~ 10월

18 청초호유원지 북측 데크로드 조성사업 (현안)

※ 청초호유원지 북측 내 호안변 데크로드가 단절되어 시민과 이용객들에게 불편을 초래하기에 데크로드 신규 조성으로 단절된 동선을 연결하여 시민 및 이용객들의 편의 증가를 도모하고 안전사고를 예방하고자 함

□ 사업개요

- 위 치: 교동 674-39번지(청초호유원지 북측)
- 사업량: 데크로드 조성 및 경관조명 설치 1식
- 사업내용
 - 데크로드(3.0m×141m) 및 데크휴게쉼터 조성
 - 인조화강석블럭포장(286㎡) 공사
 - 경관조명 2개소, 보안등 3대 및 볼라드 23대 설치 등
 - 기존 수목 22주 등 이식 공사
- 사업비: 400백만원
- 사업기간: '22. 1월 ~ 7월

□ 주요 추진상황

- 사업대상지 현장 점검 완료: '22. 1월
- 데크로드 조성사업 실시설계용역 완료: '22. 3월
- 일상감사 및 계약심사 완료: '22. 4월
- 데크로드 조성사업 착공: '22. 5월
- 철거공 및 식재공 완료: '22. 5월
- 포장공 및 우수공 완료: '22. 6월
- 시설공(데크로드, LED경관조명 설치) 시행: '22. 6월 ~ 7월

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
400	-	-	400	-	-	400	-	-

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 전기 인입공사 등 시행: '22. 7월
- 청초호유원지 북측 데크로드 조성공사 완료: '22. 7월

19 청초호유원지 농구장 교체사업 (현안)

※ 노후한 청초호유원지 농구장 시설물을 교체하여 청초호유원지를 이용하는 시민들에게 쾌적하고 안전한 편의시설을 제공코자 함.

□ 사업개요

- 위 치: 속초시 조양동 1544-2(청초호유원지 남측)
- 사 업 량: 1개소(490m²)
- 사업내용
 - 기존 우레탄 바닥 및 주변 노후 시설물 철거
 - 바닥재(플라스틱 바닥재) 설치
 - 수목 식재 및 벤치, 퍼걸러 등 편의시설 설치
 - 농구장 주변 안전휰스 및 경관조명 설치(투광등 및 로고라이트 등)
- 사 업 비: 400백만원(체육기금 120, 시비 280)
- 사업기간: '22년 1월 ~ 7월
- 사업방법: 도급 시행

□ 주요 추진상황

- 사업 계획 수립: '22. 1. 11
- 실시설계 용역 완료: '22. 3월
- 공사(조경, 전기, 폐기물처리) 착공: '22. 4월
 - 봄꽃 화단 조성 및 청초누리 봄빛행사 등에 따라 시민 불편을 해소하고자 5월 초부터 작업 진행
- 기성 신청에 따른 제1회 기성금 지출: '22. 6. 20
 - 80% 이상 공사 작업 완료(플라스틱 바닥재, 벤치·퍼걸러, 안전용 휰스 등 설치 완료)
 - 투광등, 공원등 및 야간경관조명기구(민들레조명 등) 설치 완료

□ 재원확보 현황

(단위:백만원)

총사업비	'20년까지 투자액	'21년 투자액	'22년도 투자계획					'23년 이후
			소계	국비	도비	시비	기타	
400	-	-	400	-	-	280	120	-

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 공사(조경, 전기) 준공: '22. 7월중

민간단체 지방보조금 지원현황

(단위 : 백만원)

보조단체명	사업명	2021년 보조액	사업기간	추진실적	2022년 예산액
관내 자율방범대 5개 단체	산불예방 사회단체 지원사업	총액 : 7.0 도비 : 2.1 시비 : 4.9	2021.3.15. ~ 2021.5.15.	- 산불예방순찰 및 홍보	총액 : 8.75 도비 : 2.63 시비 : 6.12
